ЦРКВА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЂАКОВИЦИ

црквени комплекс – након рушења – март 2004.

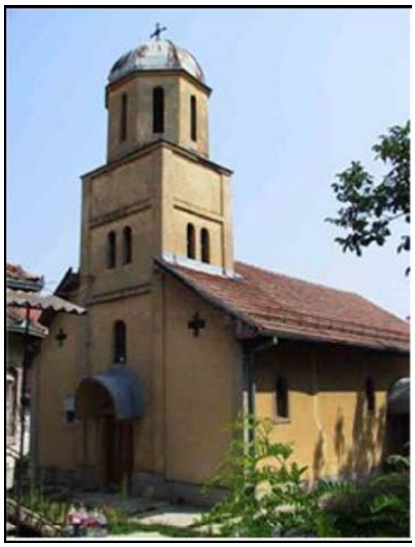

црква стање из 1999.

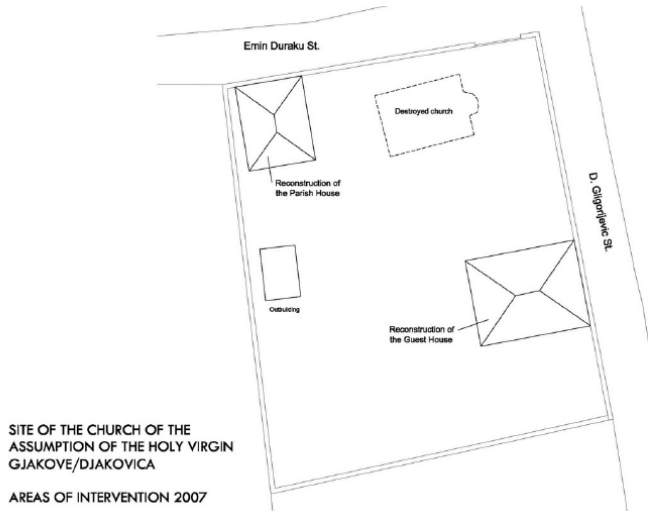

ситуациони план црквеног комплекса

1. Општи подаци о културном добру

Културно добро	Споменик културе XIX век
Категоризација	Заштићено културно добро
Место/општина	Ђаковица, општина Ђаковица
Власник:	Српска Православна Црква

2. Опис културног добра

Црква Успења Пресвете Богородице налази се у старом историјском делу Ђаковице. Црквени комплекс поред црве посвећеној Успењеу Пресвете Богородице, обухвата још две зграде намрењене становању, саграђене крајем XIX века.

Црква је била мала једнобродна грађевина засведена плитким полуобличастим сводом са кружном апсидом на источној страни. На западној страни издизао се

звоник квадратне основе завршен тамуром и куполом. У унутрашњости цркве, на западној страни, изнад припрате био је изграђена галерија.

У цркви се чувала вредна збирка икона и црквених предмета из XVIII - XIX века. Црква и грађевине црквеног комплекса су марта 2004. г. опљачкане, запаљене и до темеља срушене.

3. Програми и пројекти обнове

Пројектом обнове предвиђени су радови на санацији и реконструкцији цркве.

Обнова цркве и грађевина црквеног коплекса засновани су на следећим конзерваторским начелима:
- очувању историјских, архитектонских, урбанистичких и амбијенталних вредности цркве и грађевина црквеног коплекса
- очувању аутентичности архитектонских облика, конструкција и материјала,
- примена нових грађевинских материјала и конструкција,

Радови на обнови грађевина црквеног комплекса, спроведени у периоду 2005.-2007.г. обухватају неколико фаза и то:

1. Интервентне мере заштите (2005. г.)

2. Прва фаза обнове (2006.г.)
   - Обнова и реконструкција оградног зида дворишта цркве,

3. Друга фаза обнове (2007.г.)
   - Обнова и реконструкција конака ("кућице за баке"),
   - Обнова и реконструкција парохијског дома,

3.1. Пројектна и тендерска документација:

Покрајински завод за заштиту споменика културе – Приштина / Лепосавић
Биро за пројектовање "Јабука" – Горњи Милановац

3.2. Извођач радова:

- **интервентне мере заштите (2005)**

" AMERICAN INVEST " - Ђаковица

- **прва фаза обнове (2006)**

"PLEĆJA 2' - Истинић/Дечане

- **друга фаза обнове (2007/2008)**

"PLEĆJA 2' - Истинић/Дечане

3.3. Уговорени радови:

- **интервентне мере заштите (2005)**

Висина уговорених и изведених радова: 16.545 €

- **прва фаза обнове (2006)**

Висина уговорених и изведених радова: 88.525 €

- **друга фаза обнове (2007/2008)**

Висина уговорених и изведених радова: 196.671 €

3.4. Надзорни орган:

- **интервентни радови (2005)**

дипл.инж.арх. Јовица Лукић
дипл.инж.арх. Фатон Пруфи

- **прва фаза обнове (2006)**

дипл.инж.арх Милан Цатић

- **друга фаза обнове (2007/2008)**

дипл.инж.арх Милан Цатић

3.5. Супервизори:

- **интервентни радови (2005)**

дипл.инж.арх. Зоран Гарић
дипл.инж.арх. Милан Цатић
дипл.инж.арх. Осман Гојани

3.6. Време извођења радова:

- **интервентни радови (2005)**

септембар - децембар 2005.

- **прва фаза обнове (2006)**

новембар 2006. – фебруар 2007.

- **друга фаза обнове (2007/2008)**

новембар 2007. – мај 2008.

4. Опис изведених радова:

4.1. интервентни радови (2005)

- чишћење дворишта од шута,смећа, вегетације,сасушене траве, џакова са песком и остатака сагореле грађе,
- демонтажа урушених и демолираних делова грађевина (зграде за становање и црква) које се налазе на североисточном делу,
- израда металне ограде дворишта цркве кутијастим профилима дим. 5 x 5 см, висине 2,00 м, анкерованих за бетонске темеље, дим. 0,30 x 0,30 x 0,50 м, између којих је затегнута поцинкована мрежа,
- одвоз шута на месту предходно одређене депоније,

4.2. прва фаза обнове (2006/2007)

4.2.1.Обнова и реконструкција дворишног оградног зида

- демонтажа металне ограде црквене порте,
- ископ земље за тракасте темеље оградног зида црквене порте,
- израда армирано бетонских темеља оградног зида црквене порте,
- зидање оградног дворишног зида од каменог облутка (два лица) у цементном малтеру,
- израда армирано бетонских стубова и серклажа уграђених у "језгро зида" ради статичке и сеизмичке стабилности зидне конструкције,
- дерсовање лица зида продужним малтером,
- кречење лица и наличја оградног дворишног зида,
- израда дрвене кровне конструкције за заштиту оградног дворишног зида,
- покривање крова оградног дворишног зида фалцованим црепом,
- израда и монтажа улазних капија израђених од храстове грађе,

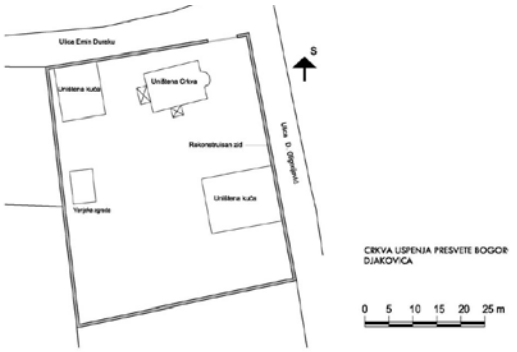

4.3. друга фаза обнове (2007/2008)

4.3.1. Обнова и реконструкција конака ("кућица за баке")

Предходни радови

- ископ земље за израду темеља,
- одвоз шута и земље на депонију,

Конструкција

- бетонирање армирано бетонских темеља грађевине,
- бетонирање подрумских армирано-бетонских зидова,
- зидање конструктивних зидова керамичким блоковима у продужном малтеру,
- зидање преградних зидова керамичким блоковима у продужном малтеру,
- зидање димњака пуном опеком у продужном малтеру,
- облагање подрумских зидова пуном опеком ради заштите вертикалне хидрпизолације,
- израда међуспратне ситноребрасте,полумонтажне конструкције система "Ферт",
- израда дрвене кровне конструкције,
- подашчање кровних равни,покривање тер хартијом и летвисање крова,

Ентеријер

- малтерисање и тонирање зидова и плафона, (
- уградња нових прозора и врата од храстове грађе,

Екстеријер

- малтерисање и моловање фасада,
- израда термоизолације на фасадним зидовима,

Радови су у току.

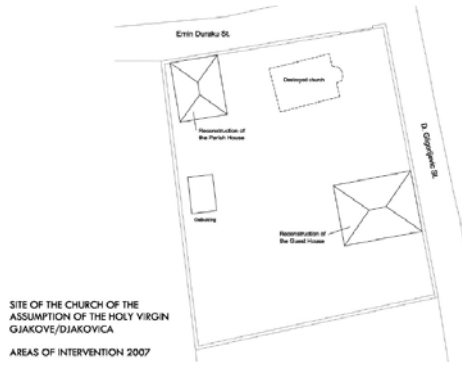

ситуација



изглед конака

4.3.2. Обнова и реконструкција парохијског дома

Предходни радови

- ископ земље за израду темеља,
- одвоз шута и земље на депонију,

Конструкција

- бетонирање армирано бетонских темеља грађевине,
- бетонирање подрумских армирано-бетонских зидова,
- зидање конструктивних зидова керамичким блоковима у продужном малтеру,
- зидање преградних зидова керамичким блоковима у продужном малтеру,
- зидање димњака пуном опеком у продужном малтеру,
- облагање подрумских зидова пуном опеком ради заштите вертикалне хидрпизолације,
- израда међуспратне ситноребрасте,полумонтажне конструкције система "Ферт",
- израда дрвене кровне конструкције,
- подашчање кровних равни,покривање тер хартијом и летвисање крова,

Ентеријер

- малтерисање и тонирање зидова и плафона, (
- уградња нових прозора и врата од храстове грађе,

Екстеријер

- малтерисање и моловање фасада,
- израда термоизолације на фасадним зидовима,

Радови су у току.

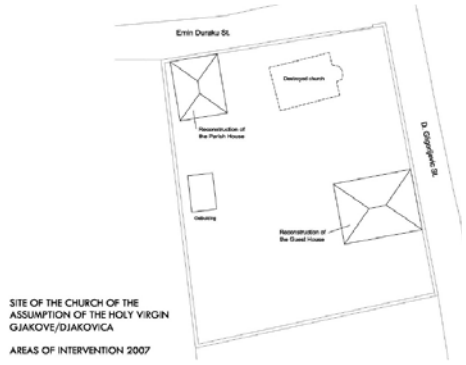

ситуација

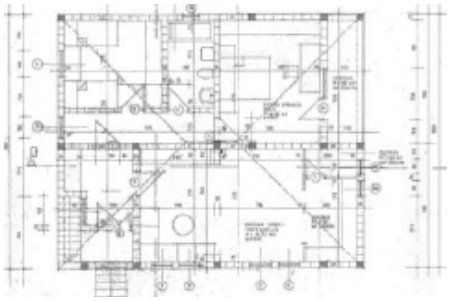

основа
